

**การดำเนินงานและ
การติดตามประเมินผล
โครงการไทยเข้มแข็ง 2553**

จังหวัดเชียงใหม่


**ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
จำนวน 164 โครงการ
งบประมาณ 181,892,900 บาท**

โครงการไทยเข้มแข็ง 2553

แยกตามกลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1. ด้านเศรษฐกิจ	109	116,302,100	63.94
2. ด้านสังคม	13	18,489,000	10.16
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ	9	11,600,000	6.38
4. ด้านความมั่นคง	29	34,201,800	18.80
5. ด้านบริหารจัดการ	4	1,300,000	0.71
รวม	164	181,892,900	

งบไทยเข้มแข็ง 2553 ที่ได้รับการจัดสรร แยกตามกลุ่มภารกิจ

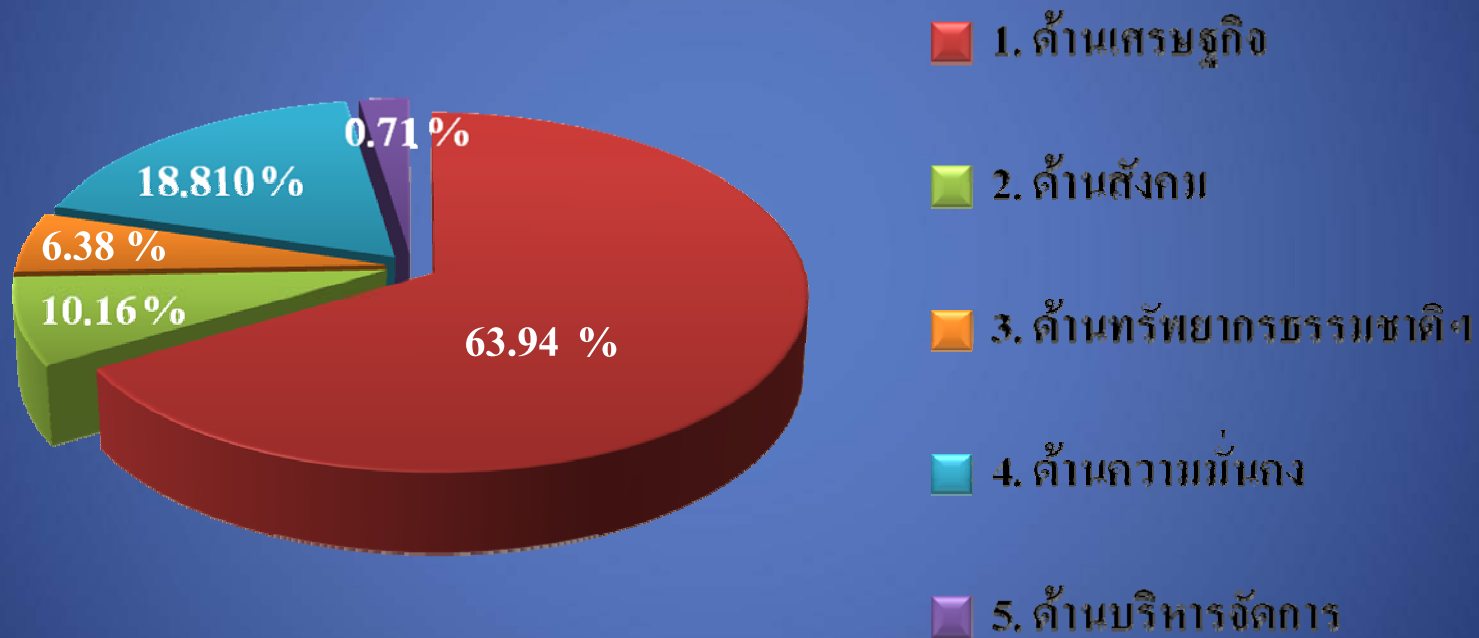

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ ในปี 2553

สถานะ	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ และจัดสรรเงินจาก สงป.	143	145.32	
2. โครงการอยู่ระหว่าง สงป. พิจารณาจัดสรรเงิน	21	32.26	

วงเงินถูกปรับลดงบประมาณภายหลังอนุมัติโครงการ ฯ จำนวน 4.40 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการไทยเข้มแข็ง 2553 แยกตามกลุ่มภารกิจ
ที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มภารกิจ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร หลังปรับลด วงเงิน(ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. ด้านเศรษฐกิจ	92	83.31	31.88	38.27	51.43	61.73
2. ด้านสังคม	13	17.53	12.27	69.99	5.26	30.01
3. ด้านทรัพยากรฯ	7	10.84	0.14	1.29	10.70	98.71
4. ด้านความมั่นคง	28	32.85	9.07	27.61	23.78	72.39
5. ด้านบริหารจัดการ	3	0.78	0.10	12.82	0.68	87.18
รวม	143	145.31	53.47	36.80	91.84	63.20

******สงป. ปรับลดวงเงินจำนวน 4.40 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553)

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายแต่ละกลุ่มภารกิจ

หน่วย : ล้านบาท

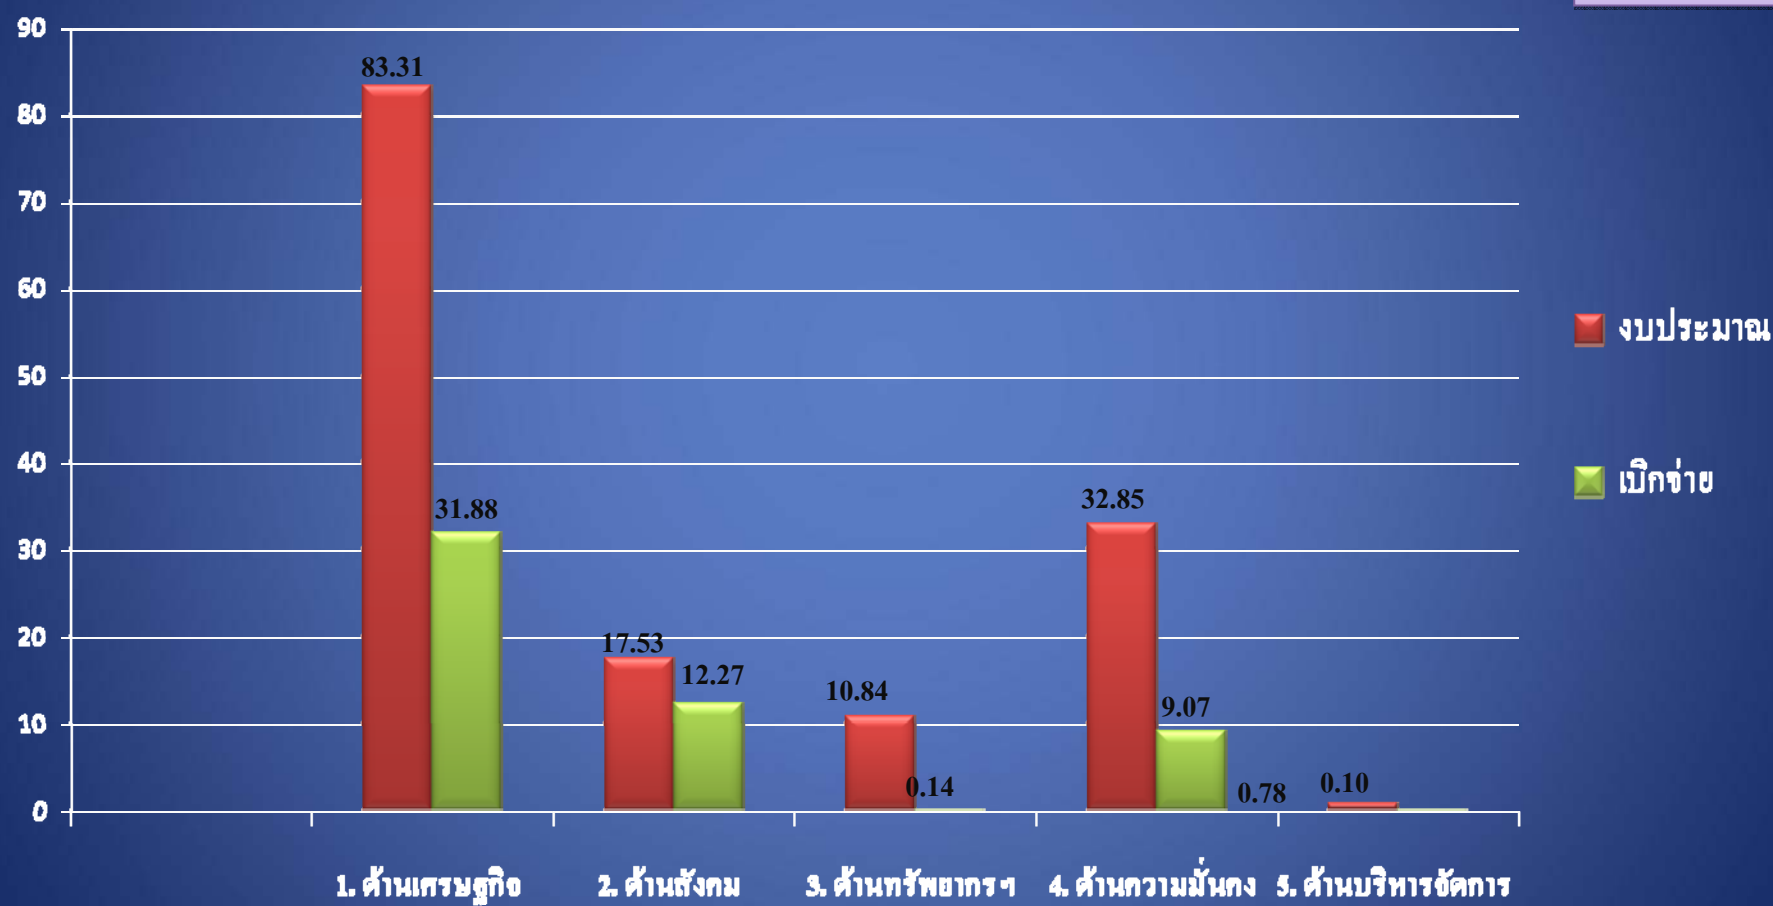

แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ

- 1) จะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
- 2) ให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก สงป. โดยห้ามทำการเปลี่ยนแปลง
- 3) เงินเหลือจ่ายไม่สามารถนำมาใช้ได้ (ส่งคืนคลัง)

การติดตามประเมินผลโครงการ

- 1) ติดตามประสิทธิผลโครงการโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ
- 2) ติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย โดยรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์
- 3) ติดตามตามแนวทางการตรวจสอบภายใน หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 4) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในลักษณะรูปเล่ม พร้อมภาพประกอบ ส่งจังหวัดเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตาม

โครงการไทยเข้มแข็ง 2553

จังหวัดเชียงใหม่

	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร	164	181,892,900	
สงป.อนุมัติโครงการ	143	145,316,950	สงป. ปรับลดวงเงิน 4,408,250 บาท
แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการฯ	15	16,834,300	อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน จากสำนักงบประมาณ
ยกเลิกโครงการ	6	15,333,400	อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยใช้โครงการจากบัญชีสำรอง y2 แทน โครงการเดิมที่ยกเลิก จาก ก.น.จ.
เบิกจ่าย	63	53,475,431.50	(ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 36.80 เปอร์เซ็นต์)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 53

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1. ปัญหาเรื่องข้อระเบียบขาดความยืดหยุ่น ไม่มีการมอบอำนาจการบริหารเปลี่ยนแปลงโครงการให้กับจังหวัด
- 2. ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ทำให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- 3. งบประมาณบางโครงการซ้ำซ้อนกับ งบปม.ของ อปท. หรือ งบประมาณของกระทรวง กรม ทำให้ต้องมีการยกเลิก
